



dekonta

Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov

- zkušenosti zhotovitele

červen, 2009



Základní údaje

- zadavatel - Městys Dolní Cerekev
- realizováno od března 2007 do června 2008 sdružením „DEKONTA-LIDAŘÍK“
- jednalo se o dříve neřešenou starou ekologickou zátěž, evidovanou jako dlouhodobá havárie na podzemních vodách
- skládka průmyslových odpadů se nacházela cca 1,5 km jihovýchodně od obce Nový Rychnov, okres Pelhřimov
- celkové náklady na sanaci 29,1 mil. Kč bez DPH (34,6 mil Kč vč. DPH)
- rozpočet na sanaci 30,5 mil Kč bez DPH (36,3 mil Kč vč. DPH)





Projekt

SANACE ŠKLÁDKY PRŮMYŠLOVÉHO ODPADU V K.Ú. NOVÝ RYCHNOV



je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj – Operační program Infrastruktura,
Státním fondem životního prostředí České republiky a krajem Vysočina



Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí



Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR



Spolufinancující subjekt: kraj Vysočina



Příjemce podpory – investor: Městys Dolní Cerekev



Financování projektu:

Celkové náklady:	40.840.839 Kč
Podpora EU z ERDF:	26.847.101 Kč
Podpora SFŽP ČR:	3.579.613 Kč
Podpora KRAJ VYSOČINA:	10.414.125 Kč

Zhotovitel:
DEKONTA, a.s.



Dozor a řízení projektu:
RNDr. RADKA FŮRYCHOVÁ
ATD Jihlava, s.r.o.

Definice problému

1971 - zřízena skládka průmyslových odpadů v opuštěném žulovém lomu

- ukládány kaly z galvanického pokovování, neutralizačních stanic a kalírenské soli

- ilegálně ukládány agrochemikálie (pesticidy), odmašťovadla (CIU)

1983 – ukončeno skládkování (kontaminace podz. vod, ohrožení prameniště Šance)

1993 - pokus o izolaci skládky proti srážkám



2007 – zahájení odstranění odpadů a sanace PV




Přípravné stavební práce



Přípravné sanační práce – GF průzkum

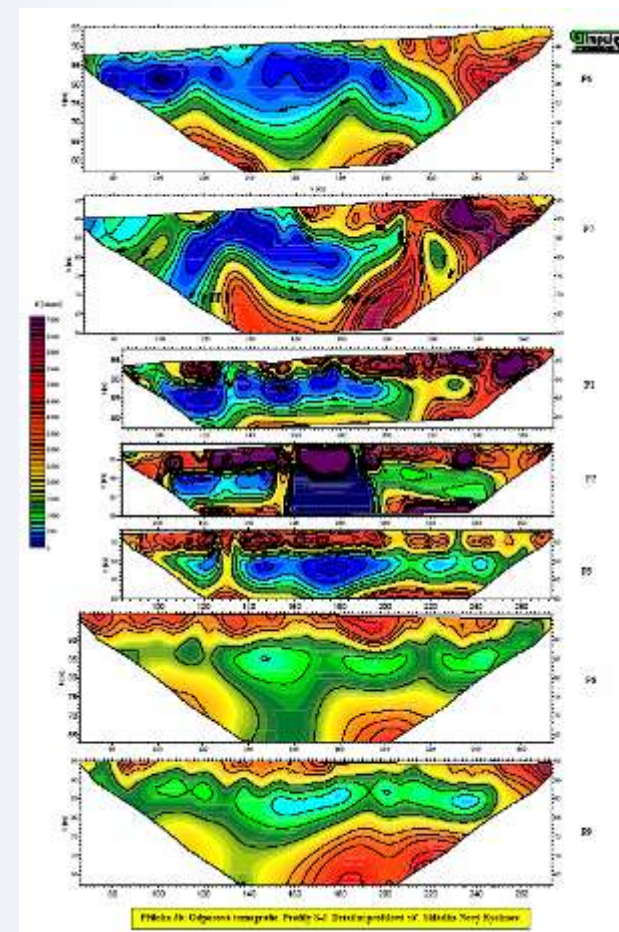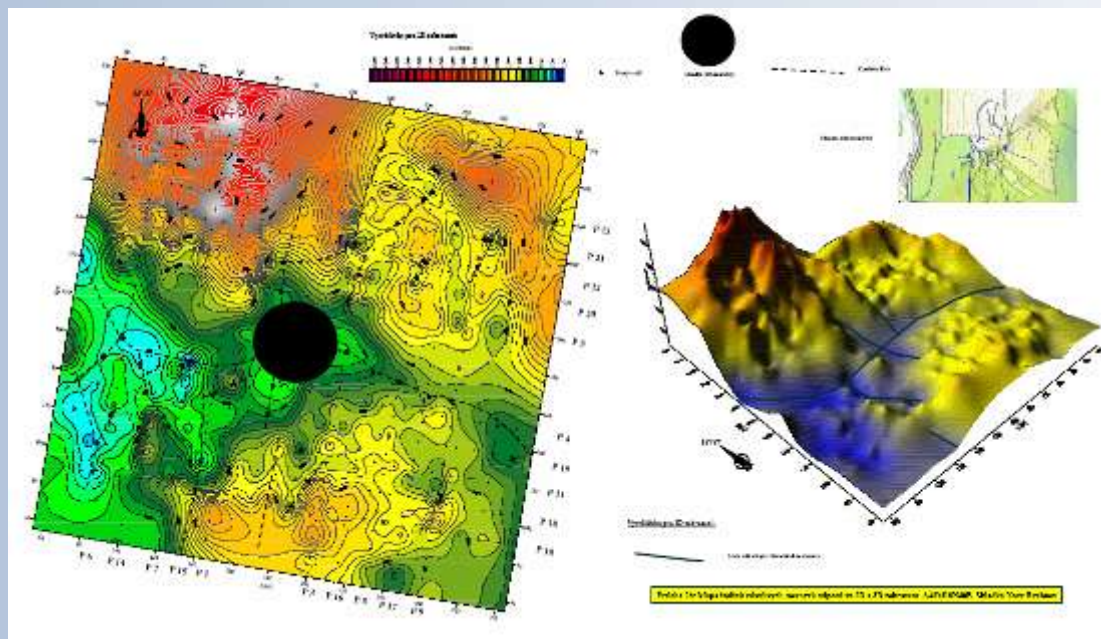

Průzkum skládky

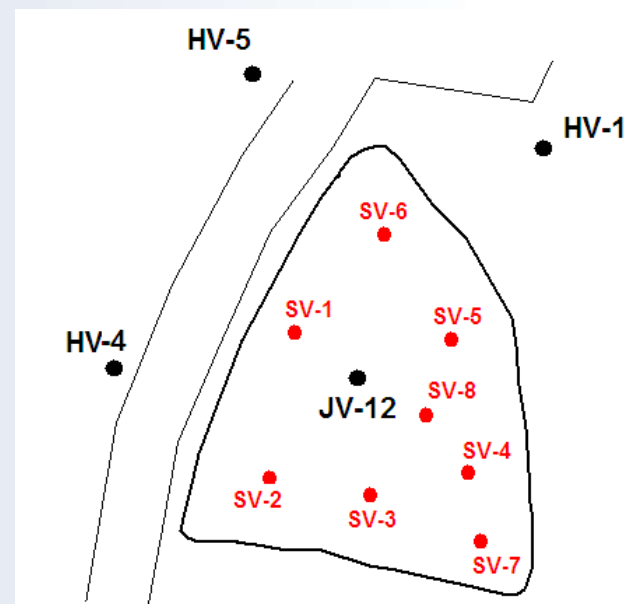


v tělese skládky se nacházelo cca 720 m³, cca 1300 t nebezpečných odpadů

odpady silně kontaminované alifatickými chlorovanými uhlovodíky (koncentrace TCE a PCE), ropnými látkami a chlorovanými pesticidy typu HCH, p,p'-DDT, p,p'-DDE


Úvodní monitoring a vrtné práce



Postup sanace - doprůzkum PV - CIU

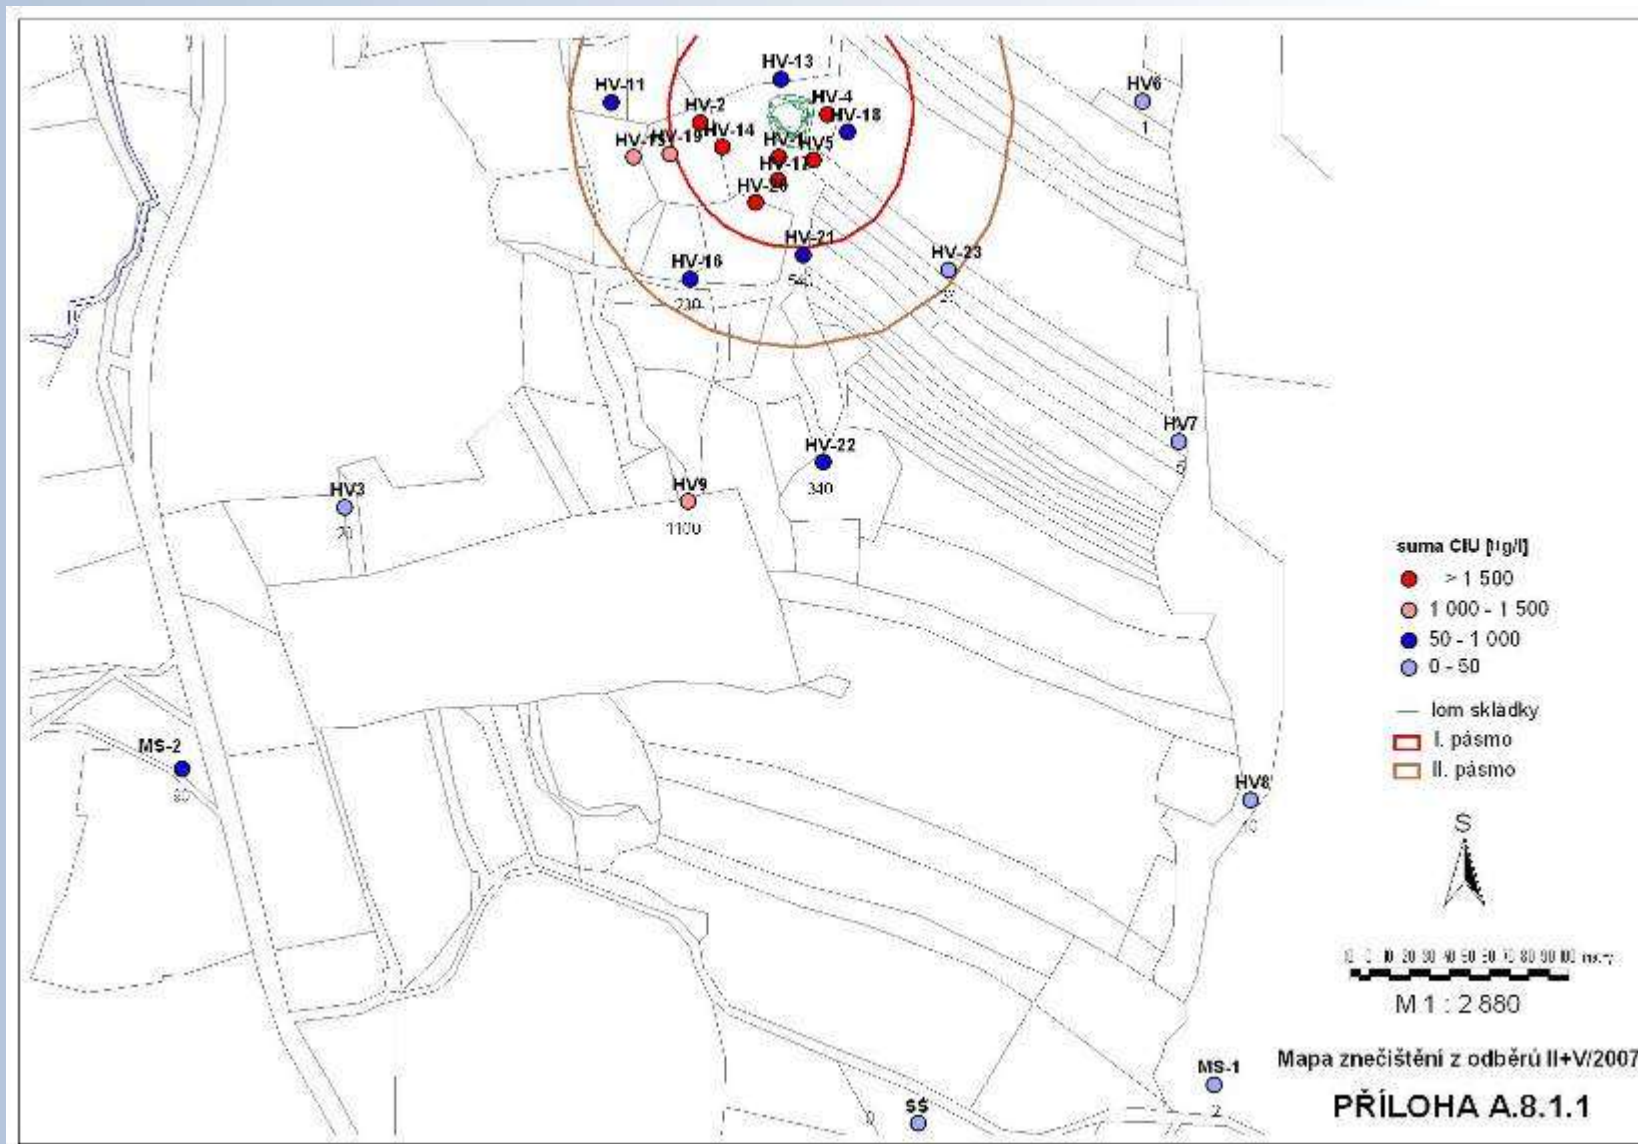

Postup sanace - doprůzkum PV - OCP

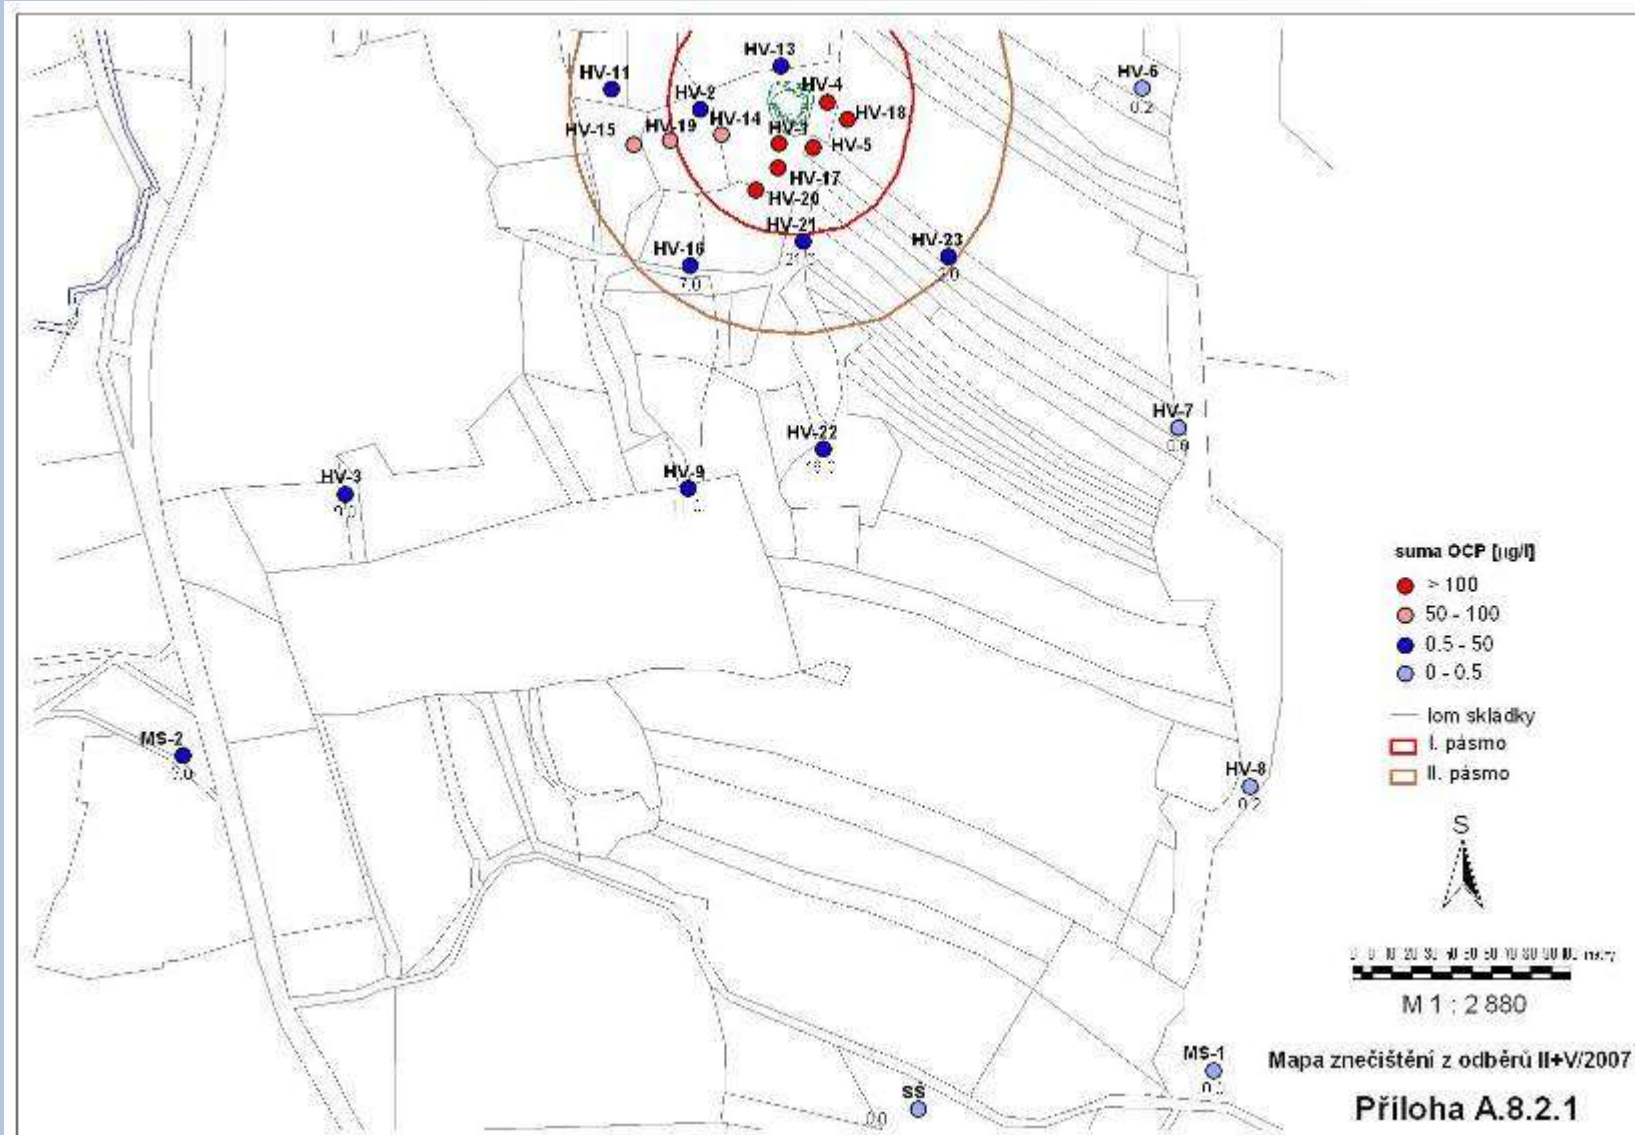

1. Fáze - odstranění překryvných vrstev



1.Fáze - vymístění odpadů z prostoru lomu

Celkem bylo z prostoru lomu odstraněno **2 040,36 t** toxických opadů
(cca 13 t CIU, cca 8 t ropných látek, cca 8 t toxických kovů)


Způsob odstranění: termické ve spalovně NO, uložení na skládce NO
(část odpadů s předúpravou stabilizací)



1.Fáze – dočištění, úprava dna lomu




2.Fáze - sanace podzemních vod


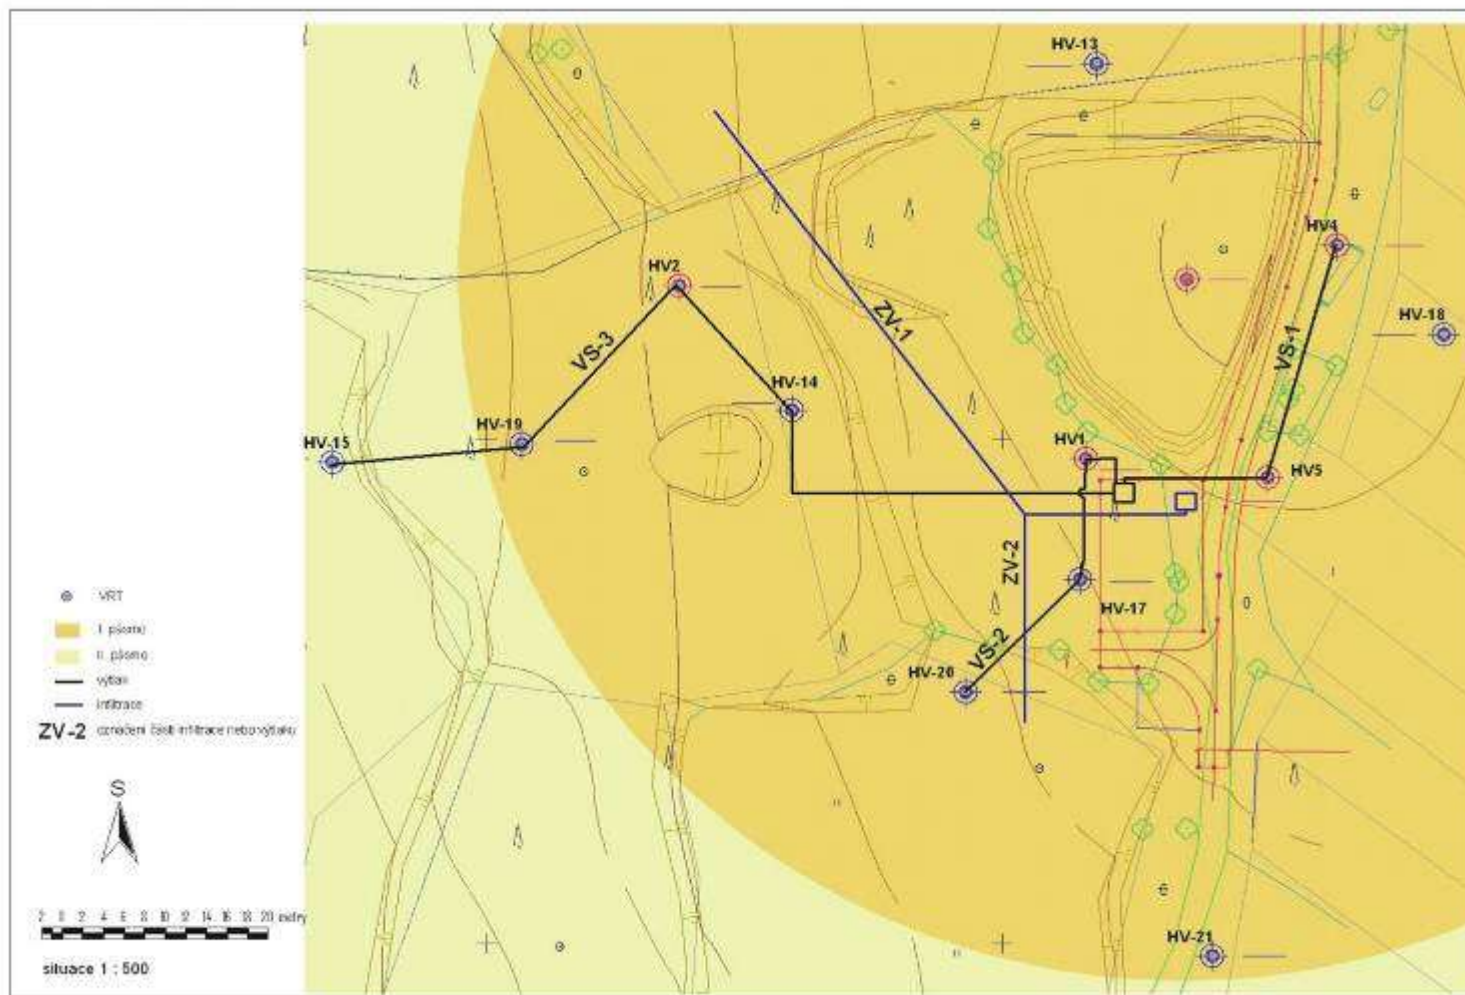


Vrt HV 1 – porovnání vývoje koncentrací CIU a OCP

HV 1



HV 1

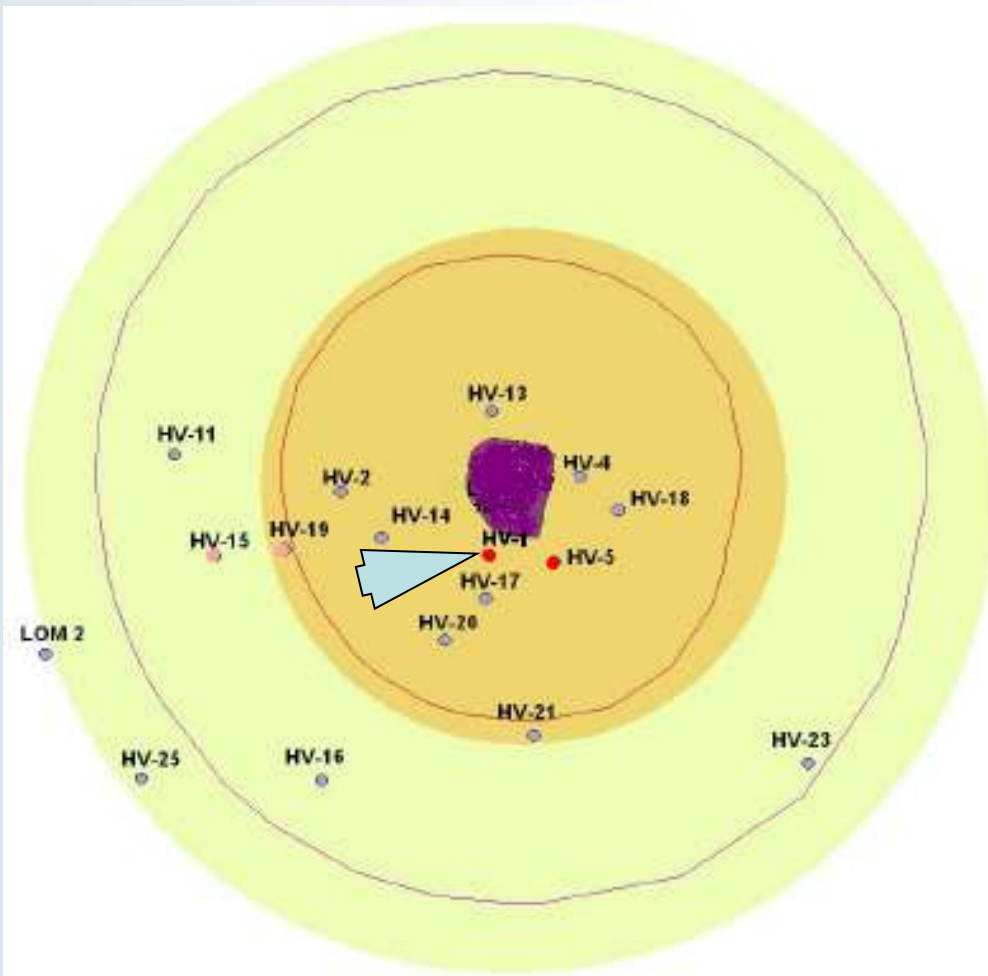

Ověření možnosti aplikace ISCO

- 1) Stopovací zkouška - fluorescein
- 2) Aplikace Fentonova činidla
 - kombinace peroxidu vodíku a síranu železnatého

Závěr: neúspěšné, malá hltnost vrtů, nevhodné pro puklinový systém ($K_f 10^{-7}$ m/s)

vrt	10% roztok H_2O_2 (l)	35% roztok H_2O_2 (l)	celkem, tj. 35% roztok H_2O_2 (l)
HLV-1	1 250	170	527
HLV-5	320	80	171
HV-1	120	130	164
HV-4	180	100	151
HV-5	140	110	150
celkem	2 010	590	1 164



Zhodnocení sanace podz. vod

- došlo k výraznému **snížení kontaminace podzemní vody**, a to jak z hlediska plošného, tak i z hlediska úrovně znečištění
- v zájmovém území došlo ke **zmenšení nadlimitně kontaminované plochy asi na jednu čtvrtinu původní výměry** (z cca 40 000 m² na cca 10 000 m²), čímž byl splněno kritérium úspěšnosti sanace PV



Zpětný závoz a rekultivace



Specifika realizace projektu z pohledu zhotovitele

- Omezený čas na sanaci PV ... OP Infrastruktura
- Projekt. dokumentace kompletní k okamžité realizaci, vyřízena všechna klíčová povolení (stavební, vodoprávní)
- Administrativně náročnější průběh (schvalování změn, měsíční průběžné zprávy a svolávané KD)
- Delší splatnost faktur
- Mediálně sledovaný projekt
- Vizualizace projektu

ZMĚNOVÝ LIST č.3

V rámci realizace veřejné zakázky „Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov“ byly po dohodnutí smluvní strany změněny následující položky ve výkazu výměr:

číslo pol.	položka	PŮVODNÍ ROZPOČET PROJEKTU				UPRAVENÝ ROZPOČET PROJEKTU				odůvodnění
		jedn.	počet jedn.	jedn. cena	cena celkem	nová položka	počet jedn.	jedn. cena	cena celkem	
3. Přípravné průzkumné práce										
Likvidace odpadu :										
28	Likvidace sanovaného zeminy, vč. opravy	1	8,0	3 356,-	26 848,-		12,84	3 356,-	43 091,-	Zde uváděná kontaminovaná zemina představuje vnitřní jádro z vrtných prací prováděných na lokalitě. Celková tonáž odpadu vzniklého při vrtných pracích (včetně jádra) byla vyšší (přesně 12,84 t) než se původně předpokládalo (viz příložený vážení listek).
Státnísko supervize							celkem:	12,84	43 091,-	
5. Sanace podzemních vod										
Sanční monitoring :										
29a						Laboratorní rozbor vody pro odvoz na ČOV	1	810,-	810,-	Přečistnou vodu (gravitační separace a stripování, bez RO) o objemu 30 m ³ kumulovanou v systému TPV-3 bylo nutno likvidovat odvozem na ČOV. Ze strany provozovatele ČOV byly podrobeny analýzy, dokládající kvalitativní složení vody pro její možnou likvidaci. Jednalo se o: stavení ACIX, formy dusíku, fosfor, olovo, zinek.
Státnísko supervize							celkem:		810,-	

Potvrzení změn

zhotovitel DEKONTA, s. s.	objednatel město Dolní Cerekev	supervize RNDr. R. Forychová
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

1/1

Děkuji Vám za pozornost



DEKONTA, a.s.
www.dekonta.cz
